負荷試験実施報告書にはどのように負荷をかけたのかを明記

非常電源（自家発電設備）点検表の書式は３枚

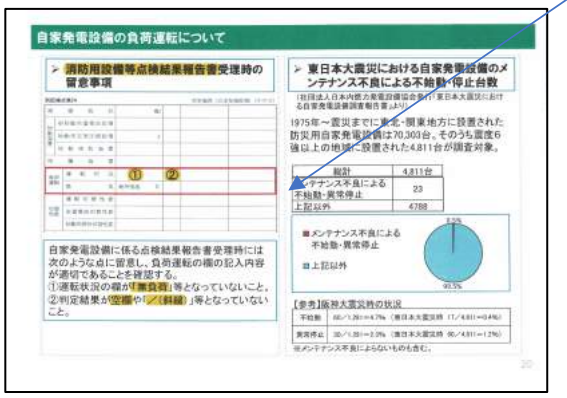



①運転状況の欄が「無負荷」となっていないこと。
②判定結果が空欄や/斜線等になっていないこと。

点検表の項目に記号（〇や×等）のみではなく、具体的な内容が記入されていること。

模擬負荷運転実施報告書

平成29 年 10 月 30 日

殿

営業担当窓口

住所	福岡市博多区御供所町1-18リビング博多4D
社名	株式会社CAN PLUS
担当者	
TEL / FAX	092-710-4233 / 092-710-4244

負荷運転実施者

住所	福岡市博多区博多駅前2-17-25博多クリエイトビル5F
社名	株式会社アステックス九国
代表者	代表取締役 鳥野 慶紀
TEL / FAX	092-292-8889 / 092-473-6232
現場責任者	

消防用設備等の点検基準及び消防用設備等点検結果報告書の様式第24 非常電源（自家発電設備）において、消防予214号に定める「30%以上の負荷運転」を、下記のとおり実施したことをご報告致します。

負荷運転実施日	平成29 年 10 月 27 日 ～ 平成29 年 10 月 27 日						
実施対象物	所在地	〒 -					
	名称						
	発電機 メーカー名	ヤンマーエネルギーシステム株式会社		型式	AP65C		
	定格出力	55 kVA	定格電圧	220 V	力率	80%	
	定格電流	A	周波数	60 Hz	製造年月	1991 年 2 月	
模擬負荷装置	品名	50kWタイプ（分割型）	型式	ALS-50D	台数	1 台	
	容量	57 kW	特記				

負荷運転記録

測定時間 自 年 (H:m)	測定時間 運転時間 (min)	周囲温度 (℃)	負荷運転記録 負荷 容量 (kW)	負荷 負荷率 (%)	電圧 (V)	相間電流(A) 規定 (A)	測定値 R相	測定値 S相	測定値 T相	備考
14:05 ～ 14:15	0:10	26	14	31.8	220	36.7	36	36.2	35.8	
14:15 ～ 14:25	0:10	26	22	50.0	220	57.7	66.8	66.5	59.9	
14:25 ～ 14:35	0:10	26	35	79.5	220	91.9	105	105.5	104.3	
～										
～										
～										
～										
～										
～										

所感・特記事項	負荷率/30%正常運転、50%正常運転、80%正常運転
	90% ラヂエーター高温以上緊急停止。
	長年、負荷運転して用いない為ラジエーター冷却水滞溜が出来ないとの見解。
	口急に、メンテナンスと再度負荷試験を復旧します。

負荷運転実施報告書170413-001 ASTECS Corp.
